

Relatório Semestral

(Out/2020 a Mar/2021)



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL





O **Amazonas Mais Verde** é um programa inserido no contexto do Plano de Prevenção do Desmatamento e Queimadas do Amazonas.

Eixo 1 - Ordenamento territorial e ambiental

Eixo 2 - Monitoramento, Comando e Controle Ambiental

Eixo 3 - Bioeconomia e alternativas econômicas sustentáveis

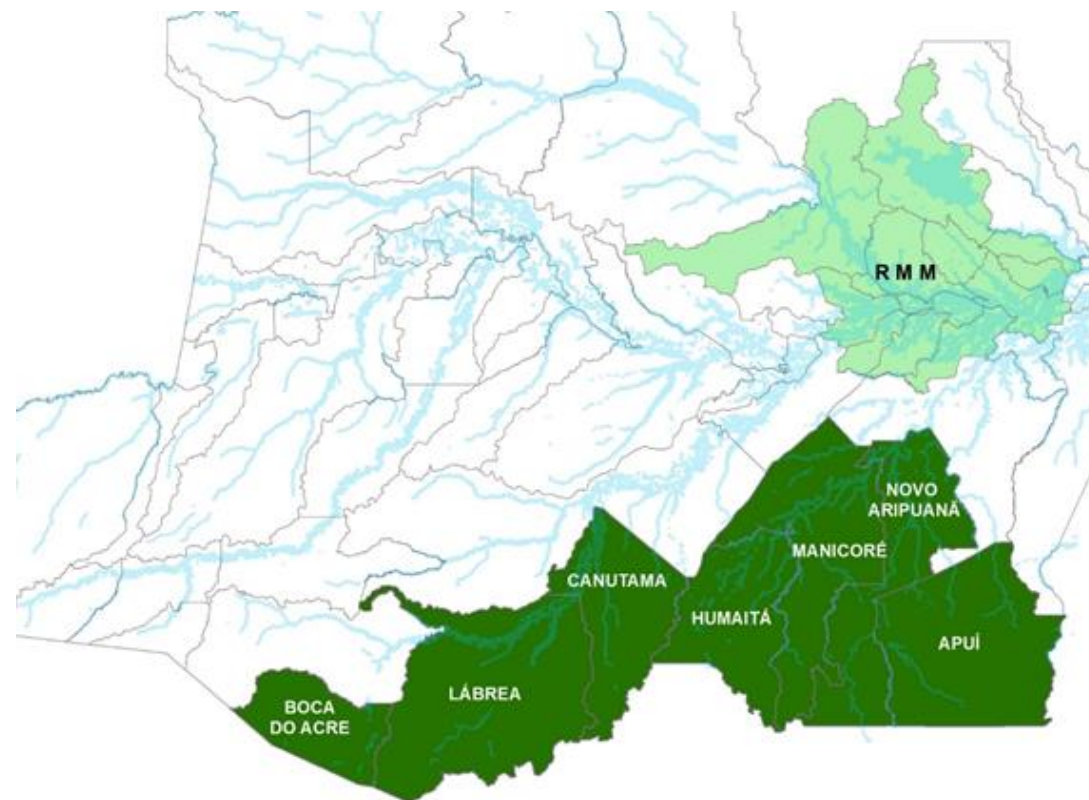

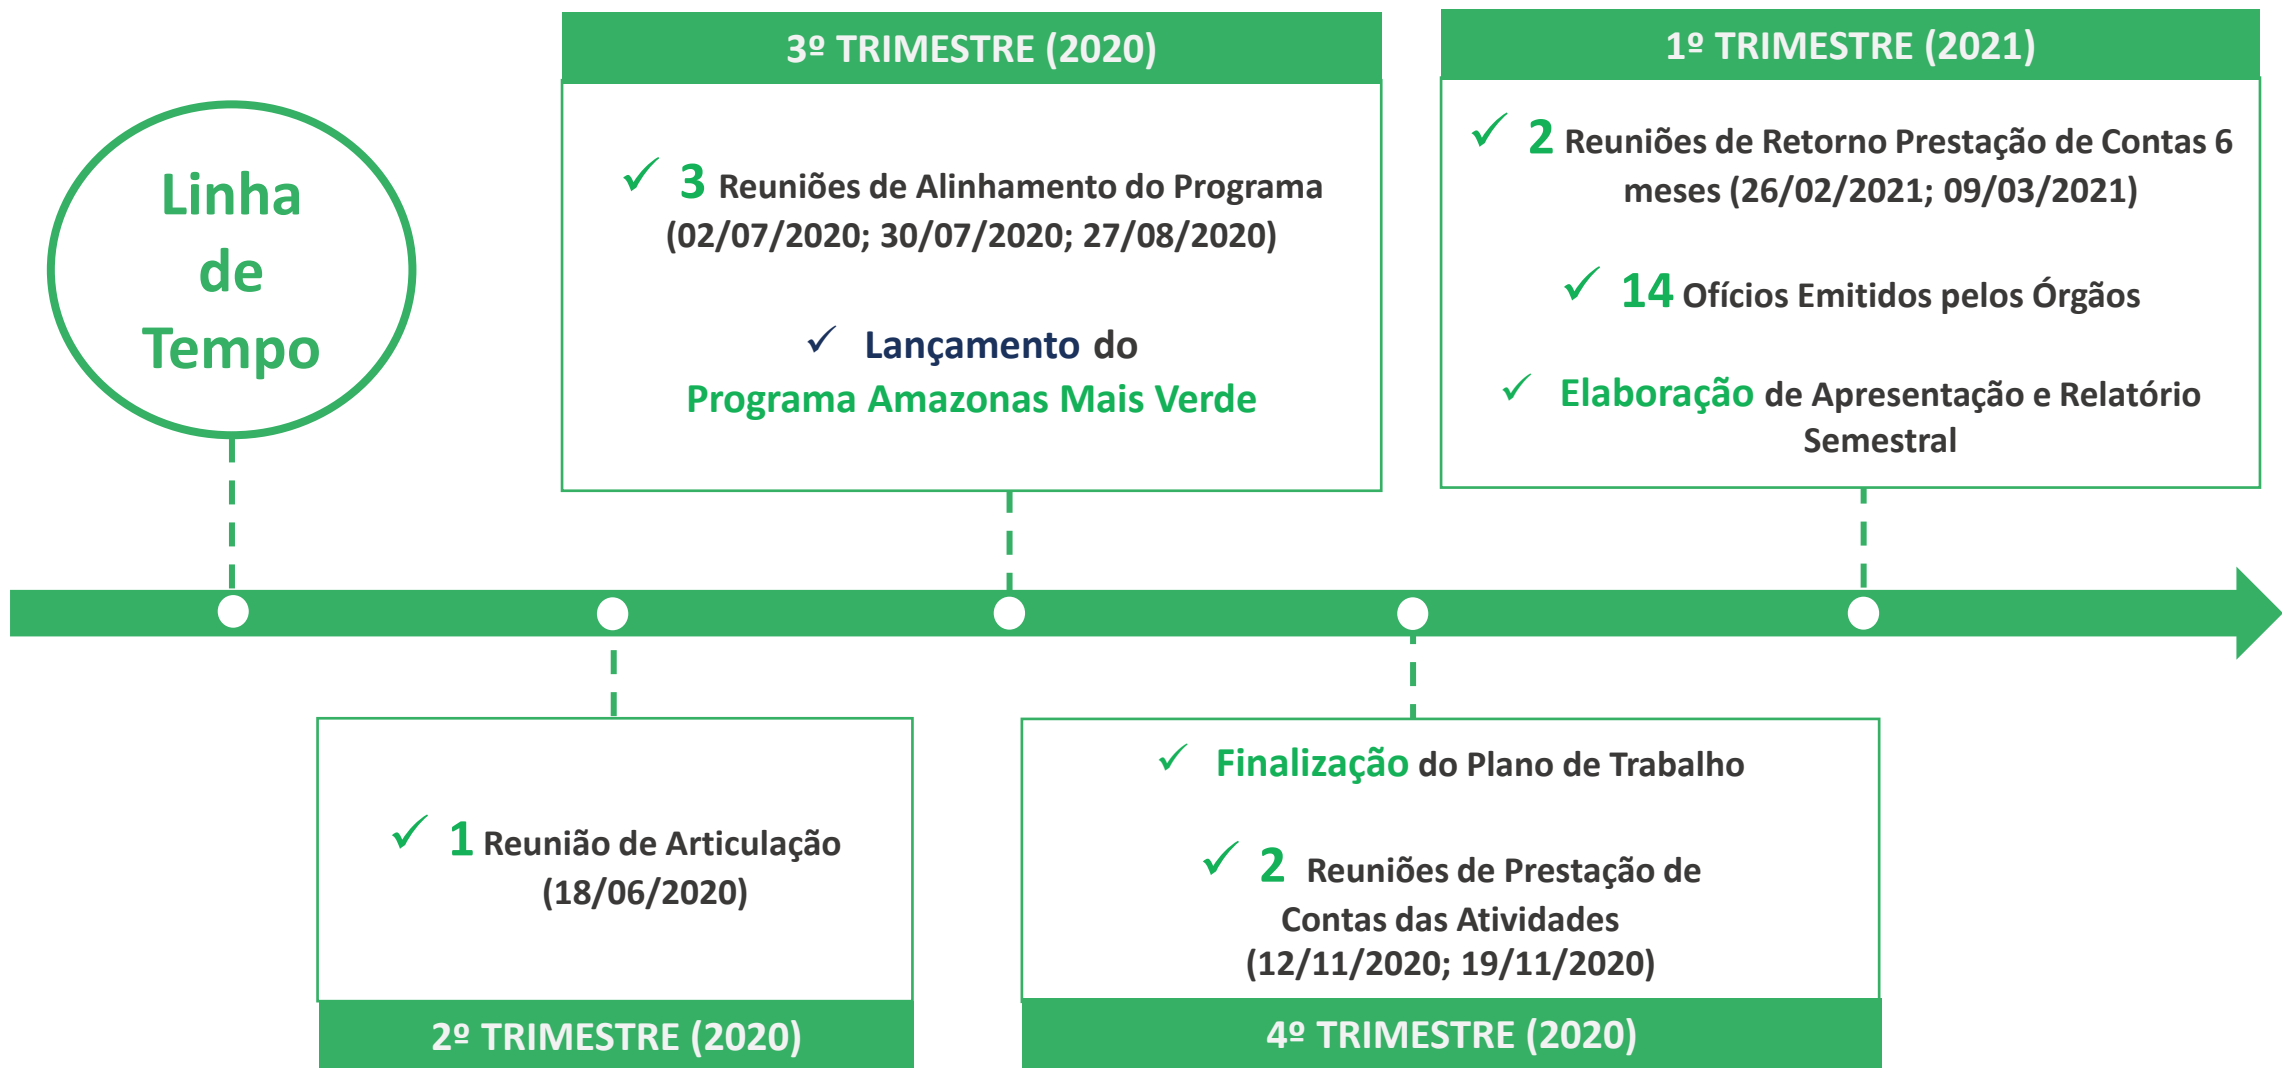

Metas Amazonas Mais Verde



META 1

REDUÇÃO do desmatamento, com **PRIORIZAÇÃO** de áreas de intensa pressão

META 2

Regularização **FUNDIÁRIA**

META 3

DESENVOLVIMENTO Sustentável

META 4

Regularização **AMBIENTAL**



REDUÇÃO do desmatamento, com
PRIORIZAÇÃO de áreas de intensa pressão

META 1

Dificuldade

- ✓ Diminuição do número de funcionários nas rotinas administrativas.
- ✓ Demora nas respostas relacionadas às cotações

Solução

- ✓ Melhorar o fluxo de comunicação com (CSC) no âmbito dos processos licitatórios.
- ✓ Reprogramação das ações de fiscalização ambiental.
- ✓ Ajuste das especificações das Ferramentas/sistemas tecnológicos (IPAAM).

EXECUTADO

*Obs: Dados não consolidados pelo PRODES, disponíveis somente a partir do 2º Semestre de 2021.

SEMA, IPAAM e SSP

- **15%** de Redução do desmatamento ilegal (**214 Km²**)



Regularização FUNDIÁRIA

META 2

EXECUTADO

0%

SECT

Dificuldade

- ✓ Restrição de circulação de pessoas e do funcionamento dos estabelecimentos comerciais em geral.

Solução

- ✓ Melhorar o fluxo de comunicação com CSC
- ✓ Buscar parcerias para atender aos servidores nos municípios fora do âmbito metropolitano;
- ✓ Informatizar a fiscalização de terras com focos de desmatamentos, conforme sinalizado pelo IPAAM;

- 15 municípios na RMM e Região Sul e Sudoeste do Estado
- Digitalização de cerca de 200 mil processos físicos com aproximadamente 6 milhões de arquivos;
- Modernização do sistema de armazenagem de dados;
- 1 Banco de dados integrado.
- Regularização 16.040 títulos.

EXECUTADO
0%
SEPROR e IDAM

Dificuldade

- ✓ Tempo de resposta dos fornecedores para envio das cotações.
- ✓ Processos licitatórios fracassados, suspensos e devolvidos.

Solução

- ✓ Retomar a abertura dos processos licitatórios.
- ✓ Garantir as aquisições dos itens suprimidos com recursos próprios.
- ✓ Construir alternativas para o início das atividades.

- ✓ Nº de produtor beneficiado
- ✓ Hectare de SAF's implantado
- ✓ Nº de Piscicultor beneficiado
- ✓ Nº de produtor beneficiado
- ✓ Hectare de área alagada
- ✓ Sistema Implantado
- ✓ Nº de Cursos, Demonstrações de Métodos (DM), Unidades Demonstrativas (UD), palestras e reuniões realizadas
- ✓ Estruturação dos Escritórios Locais do IDAM



Regularização **AMBIENTAL**

META 4

Dificuldade

- ✓ Suspensão das atividades presenciais em campo.
- ✓ Readequação de valores cotados
- ✓ Interrupção e devolução dos processos licitatórios pela CSC.

Solução

- ✓ Retomar os processos licitatórios.
- ✓ Construir alternativas para o início de algumas atividades.

EXECUTADO

0%

**SEMA, IDAM,
IPAAM**

- Inscrição de **80% dos cadastros** do sul do Estado
 - ✓ **9 mil cadastros**
- Análise de **50% dos cadastros** do sul do Estado
 - ✓ **6 mil cadastros**



Tabela 01: Orçamento X Execução

INSTITUIÇÃO	ORÇAMENTO PREVISTO	EXECUTADO	
		1º SEMESTRE (SET/20 À MAR/21)	
		R\$	%
SEMA	R\$ 7.053.120,00	-	0,00%
IPAAM	R\$ 10.000.000,00	-	0,00%
SSP	R\$ 13.000.000,00	R\$5.029.787,87	38,69%
SEPROR	R\$ 5.009.600,00	-	0,00%
IDAM	R\$ 2.830.344,41	-	0,00%
SECT	R\$ 18.293.203,62	-	0,00%
TOTAL	R\$ 56.186.268,03	R\$5.029.787,87	8,95%

Fonte: SEMA/ IPAAM/ SSP/ SEPROR/ IDAM/ SECT/ SEDECTI



Cronograma Físico-Financeiro com metas parciais e totais

De acordo com os dados enviados pelas secretarias e consolidados no Relatório Semestral

PREVISTO

EXECUTADO

SEMESTRE 1 (Out/20 a Mar/21)

R\$ 5.029.787,87

8,95%

SEMESTRE 2 (Abr/21 a Set/21)

R\$ 30.427.515,85

54,15%

SEMESTRE 4 (Abr/22 a Set/22)

R\$ 6.964.696,29

12,40%

SEMESTRE 3 (Out/21 a Mar/22)

R\$ 11.660.202,98

20,75%

SEMESTRE 5 (Out/22 a Mar/23)

R\$ 2.103.965,03

3,74%



Cronograma Físico-Financeiro com metas parciais e totais

Nº	META	ÓRGÃO	SEMESTRE 1 (Out/20-Mar/21)	SEMESTRE 2 (Abr/21-Set/21)	SEMESTRE 3 (Out/21-Mar/22)	SEMESTRE 4 (Abr/22-Set/22)	SEMESTRE 5 (Out/22-Mar/23)	TOTAL (R\$)
1	Fortalecer o controle ambiental e a gestão territorial.	IPAAM	0,00	R\$ 5.310.543,88	R\$ 1.863.967,59	R\$ 1.355.548,12	R\$ 1.469.940,41	R\$ 10.000.000,00
		SEMA	0,00	R\$ 4.306.984,14	R\$ 634.024,62	R\$ 709.536,60	R\$ 634.024,62	R\$ 6.284,570,00
		SSP	R\$5.029.787,87	R\$5.452.799,20	R\$1.258.706,47	R\$1.258.706,47	-	R\$ 13.000.000,01
2	Fortalecer a Governança local das Políticas Públicas Ambientais	SEMA	0,00	R\$ 467.030,00	-	R\$ 301.520,00	-	R\$ 768.550,00
TOTAL GERAL (R\$)			R\$ 5.029.787,87	R\$ 15.537.357,22	R\$ 3.756.698,68	R\$ 3.625.311,19	R\$ 2.103.965,03	R\$ 30.053.120,00



Cronograma Físico-Financeiro com metas parciais e totais

Nº.	ETAPAS	ÓRGÃO	SEMESTRE 1 (OUT/20 A MAR/21)	SEMESTRE 2 (ABR/21 A SET/21)	SEMESTRE 3 (SET/21 A FEV/22)	SEMESTRE 4 (MAR/22 A AGO/22)	TOTAL
1	Regularizar Novo Aripuanã/ Manicoré/ Humaitá/ Lábrea e Cabutama	SECT	R\$ 0,00	R\$ 5.816.417,61	-		R\$ 5.816.417,61
2	Regularizar Boca do Acre/ Eirunepé/ Pauini e Envira	SECT	-	R\$ 3.079.279,91	-		R\$ 3.079.279,91
3	Regularizar Iranduba/ Manacapuru/ Novo Airão/ Itacoatiara e Urucurituba	SECT	-	-	R\$ 6.546.321,00		R\$ 6.546.321,00
4	Regularizar Presidente Figueiredo	SECT	-	-	-	R\$ 2.851.185,10	R\$ 2.851.185,10
TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 18.293.203,62



Cronograma Físico-Financeiro com metas parciais e totais

Nº	META	ÓRGÃO	SEMESTRE 1 (Out/20-Mar/21)	SEMESTRE 2 (Abr/21-Set/21)	SEMESTRE 3 (Out/21-Mar/22)	SEMESTRE 4 (Abr/22-Set/22)	TOTAL (R\$)
1	Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	IDAM	0,00	350.800,00	1.057.183,30	488.200,00	1.896.183,30
2	Estruturação dos escritórios locais do IDAM	IDAM	0,00	934.061,11	0,00	0,00	934.061,11
TOTAL GERAL (R\$)			0,00	1.284.861,11	1.057.183,30	488.200,00	2.830.244,41
3	Fomento à implantação de Sistemas Agroflorestais	SEPROR	0,00	1.981.300,00	0,00	0,00	1.981.300,00
4	Fomento à Pesca Manejada	SEPROR	0,00	41.050,50	300.000,00	0,00	341.050,50
5	Fomento à Piscicultura	SEPROR	0,00	1.498.500,00	0,00	0,00	1.498.500,00
6	Revitalização do Centro de Transferência de Tecnologia e Produção Aquícola de Humaitá	SEPROR	0,00	747.499,50	0,00	0,00	747.499,50
7	Criação da Base de Dados Integrada - BDI do Setor Primário com informações georreferenciadas	SEPROR	0,00	441.250,00	0,00	0,00	441.250,00
TOTAL GERAL (R\$)			0,00	4.709.600,00	300.000,00	0,00	5.009.600,00



EXECUÇÃO

COORDENAÇÃO

Secretaria de
**Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação**

Secretaria do
Meio Ambiente

SECT

Secretaria
das Cidades
e Territórios

Secretaria de
**Produção
Rural**



IPAAM

Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E
FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FLORESTAL
ÓRGÃO VINCULADO AO SISTEMA SEPROR

Obrigado!



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL



PETROBRAS
